AZIENDA COMUNALE FARMACIE

AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

OGGETTO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI FARMACIA COMUNALE DI PIAZZA TEVERE N. 16

COMMITTENTE AZIENDA COMUNALE FARMACIE
Azienda Speciale del Comune di San Donato Milanese
San Donato Milanese - Milano

PROGETTO studio AZdesign
24052 Azzano San Paolo BERGAMO via Piemonte 13

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il Progettista

.....

(geom. Marco Perego)

COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI MILANO
GEOM. PEREGO MARCO N. 9241

Bergamo, Ottobre 2018

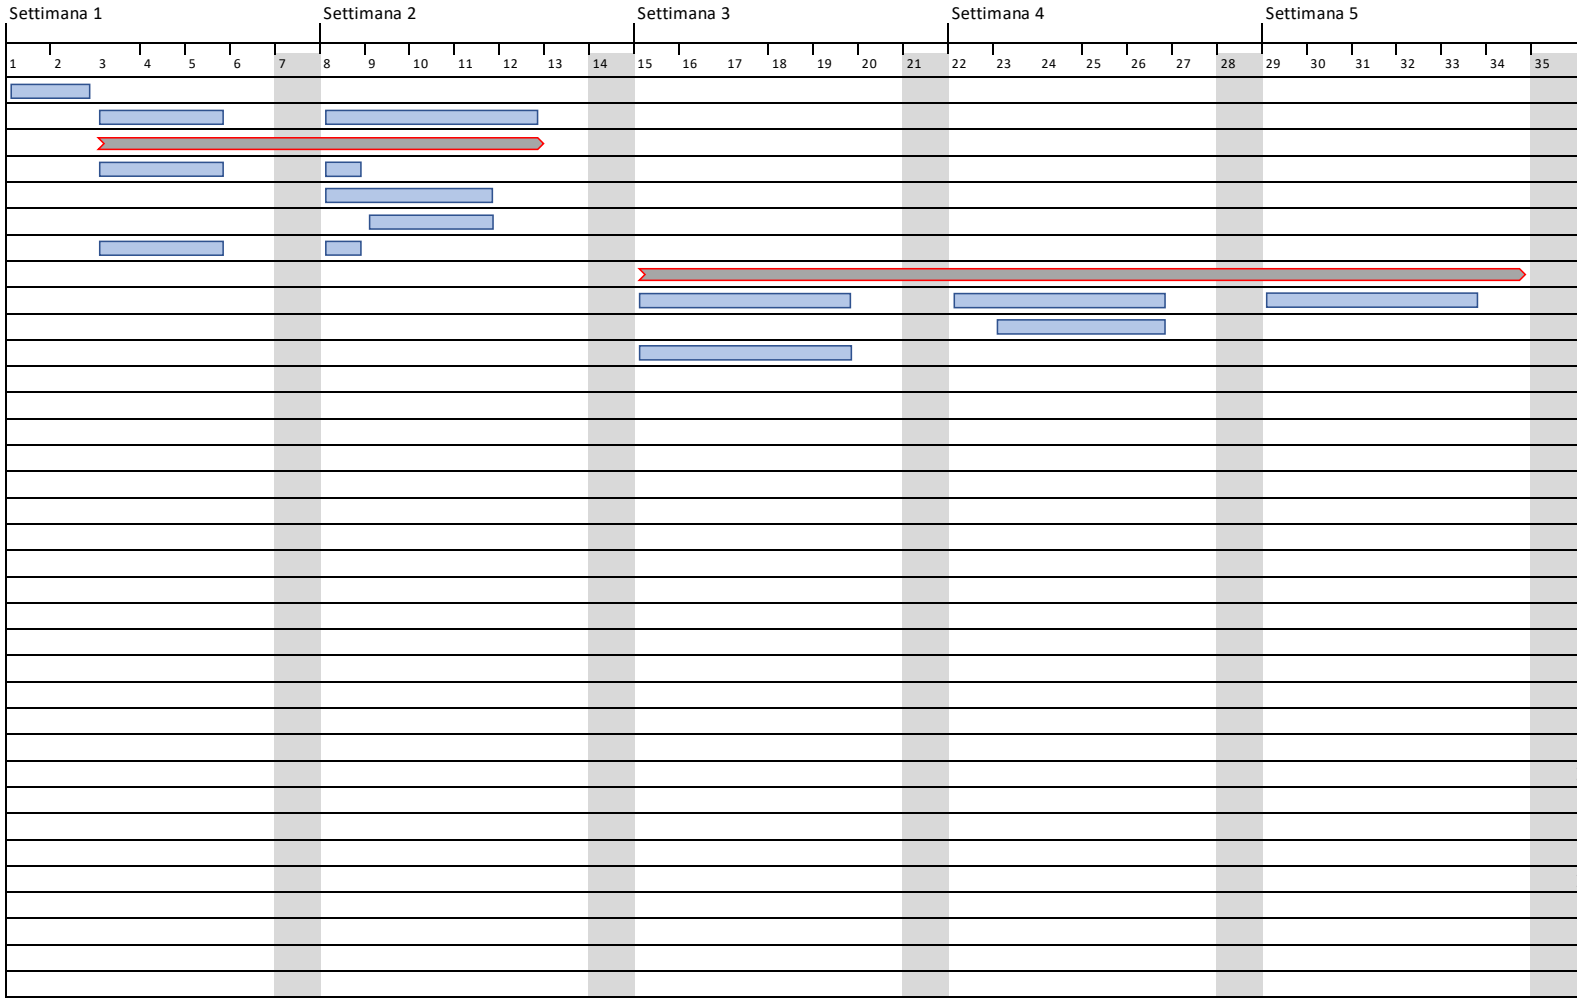
Settimana 1
Settimana 2
Settimana 3
Settimana 4
Settimana 5
LAVORAZIONE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Allestimento cantiere
Trasporti macerie e oneri di discarica
Demolizioni, rimozioni e smontaggi
° Murature
° Pavimenti e rivestimenti
° Serramenti e infissi
° Rimozione impianti e accessori
Murature, tramezze, opere c.a.
° Consolidamento solaio
° Vespaio
° Chiusura scala
Pavimenti, sottofondi, rivestimenti
° Pavimento
° Rivestimenti
° Rivestimenti arredi
Controsoffitti, pareti mobili e contropareti
° Controsoffitto
° Pareti
° Contropareti
Intonaci, tinteggiature, trattamenti
° Intonaci
° Trattamenti
° Pitturazione
Infissi, opere legno, acciaio e vetro
° Serramenti
° Porte
Impianto meccanico
° Climatizzazione
° Ricambio d'aria
° Idrico Sanitario
Impianto Elettrico
° Linee e quadri
° Corpi illuminanti
Formazione zerbino
Opere di sistemazione e pulizia

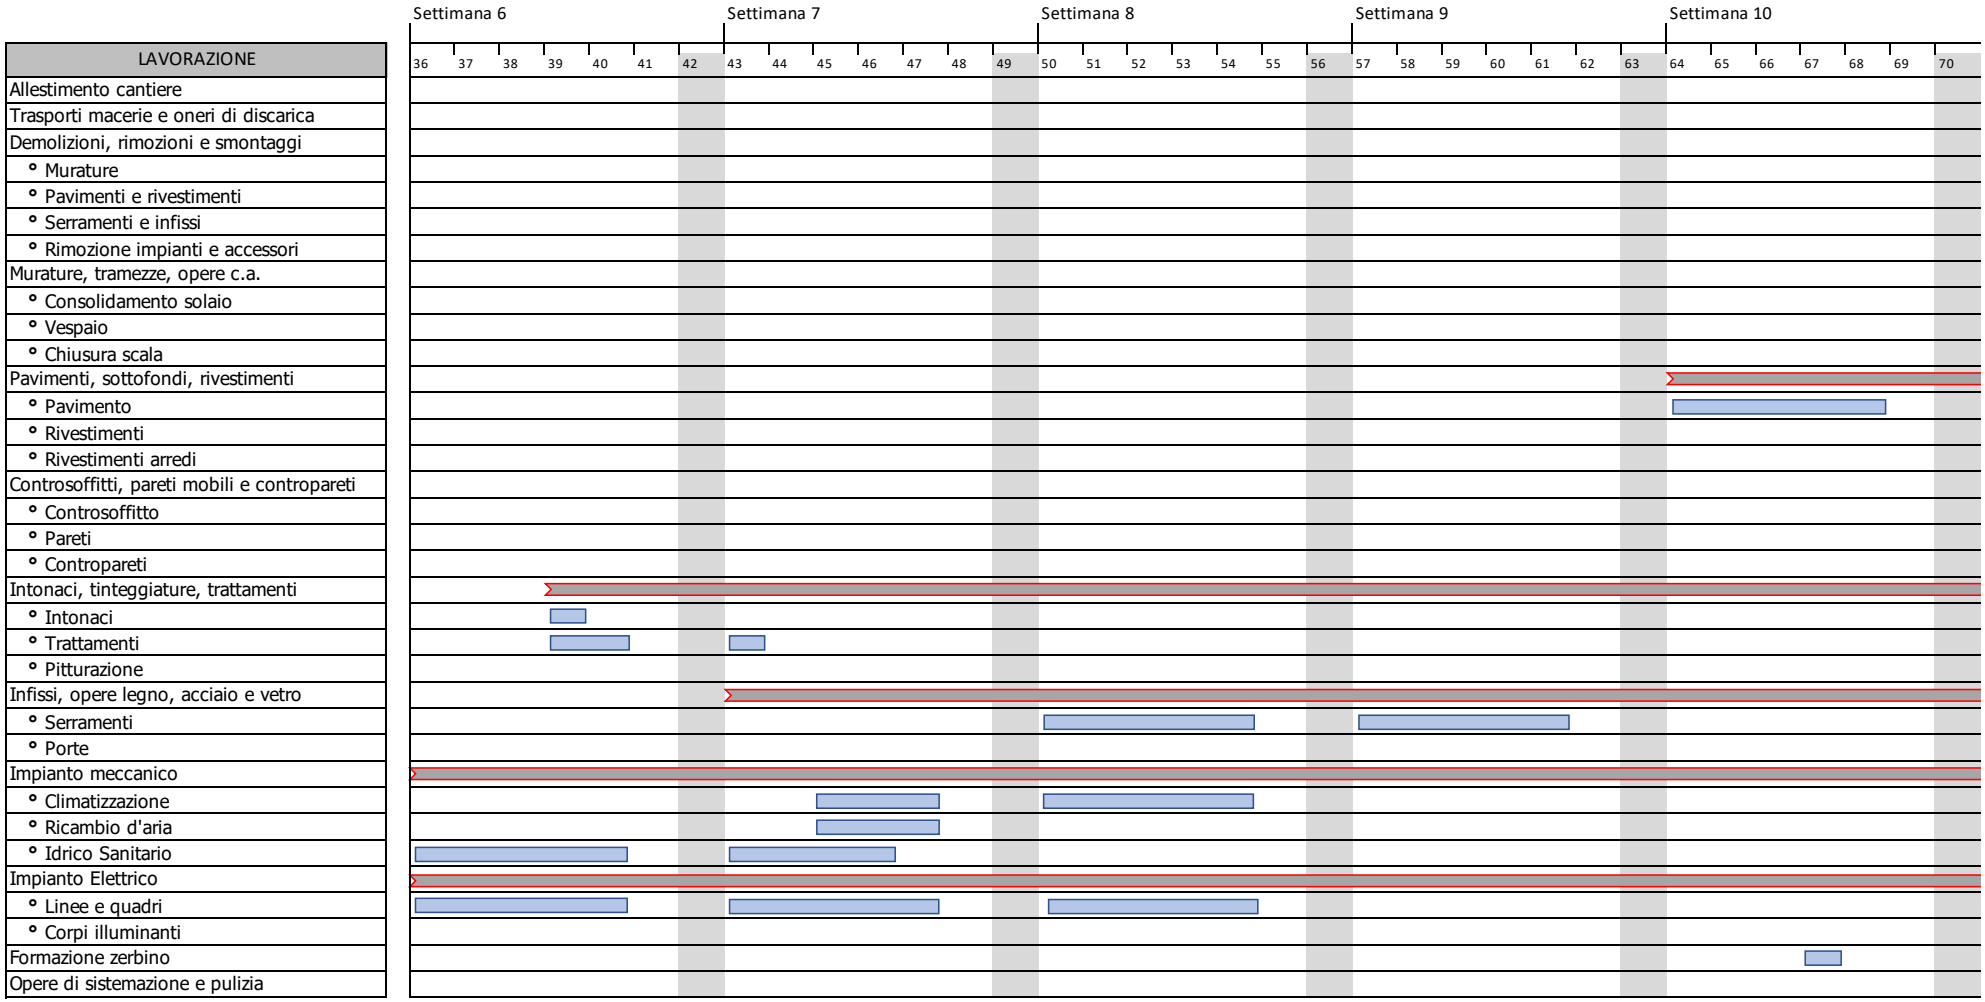
Settimana 6
Settimana 7
Settimana 8
Settimana 9
Settimana 10
LAVORAZIONE
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Allestimento cantiere
Trasporti macerie e oneri di discarica
Demolizioni, rimozioni e smontaggi
° Murature
° Pavimenti e rivestimenti
° Serramenti e infissi
° Rimozione impianti e accessori
Murature, tramezze, opere c.a.
° Consolidamento solaio
° Vespaio
° Chiusura scala
Pavimenti, sottofondi, rivestimenti
° Pavimento
° Rivestimenti
° Rivestimenti arredi
Controsoffitti, pareti mobili e contropareti
° Controsoffitto
° Pareti
° Contropareti
Intonaci, tinteggiature, trattamenti
° Intonaci
° Trattamenti
° Pitturazione
Infissi, opere legno, acciaio e vetro
° Serramenti
° Porte
Impianto meccanico
° Climatizzazione
° Ricambio d'aria
° Idrico Sanitario
Impianto Elettrico
° Linee e quadri
° Corpi illuminanti
Formazione zerbino
Opere di sistemazione e pulizia

Settimana 11
Settimana 12
Settimana 13
Settimana 14
Settimana 15
LAVORAZIONE
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
Allestimento cantiere
Trasporti macerie e oneri di discarica
Demolizioni, rimozioni e smontaggi
° Murature
° Pavimenti e rivestimenti
° Serramenti e infissi
° Rimozione impianti e accessori
Murature, tramezze, opere c.a.
° Consolidamento solaio
° Vespaio
° Chiusura scala
Pavimenti, sottofondi, rivestimenti
° Pavimento
° Rivestimenti
° Rivestimenti arredi
Controsoffitti, pareti mobili e contropareti
° Controsoffitto
° Pareti
° Contropareti
Intonaci, tinteggiature, trattamenti
° Intonaci
° Trattamenti
° Pitturazione
Infissi, opere legno, acciaio e vetro
° Serramenti
° Porte
Impianto meccanico
° Climatizzazione
° Ricambio d'aria
° Idrico Sanitario
Impianto Elettrico
° Linee e quadri
° Corpi illuminanti
Formazione zerbino
Opere di sistemazione e pulizia

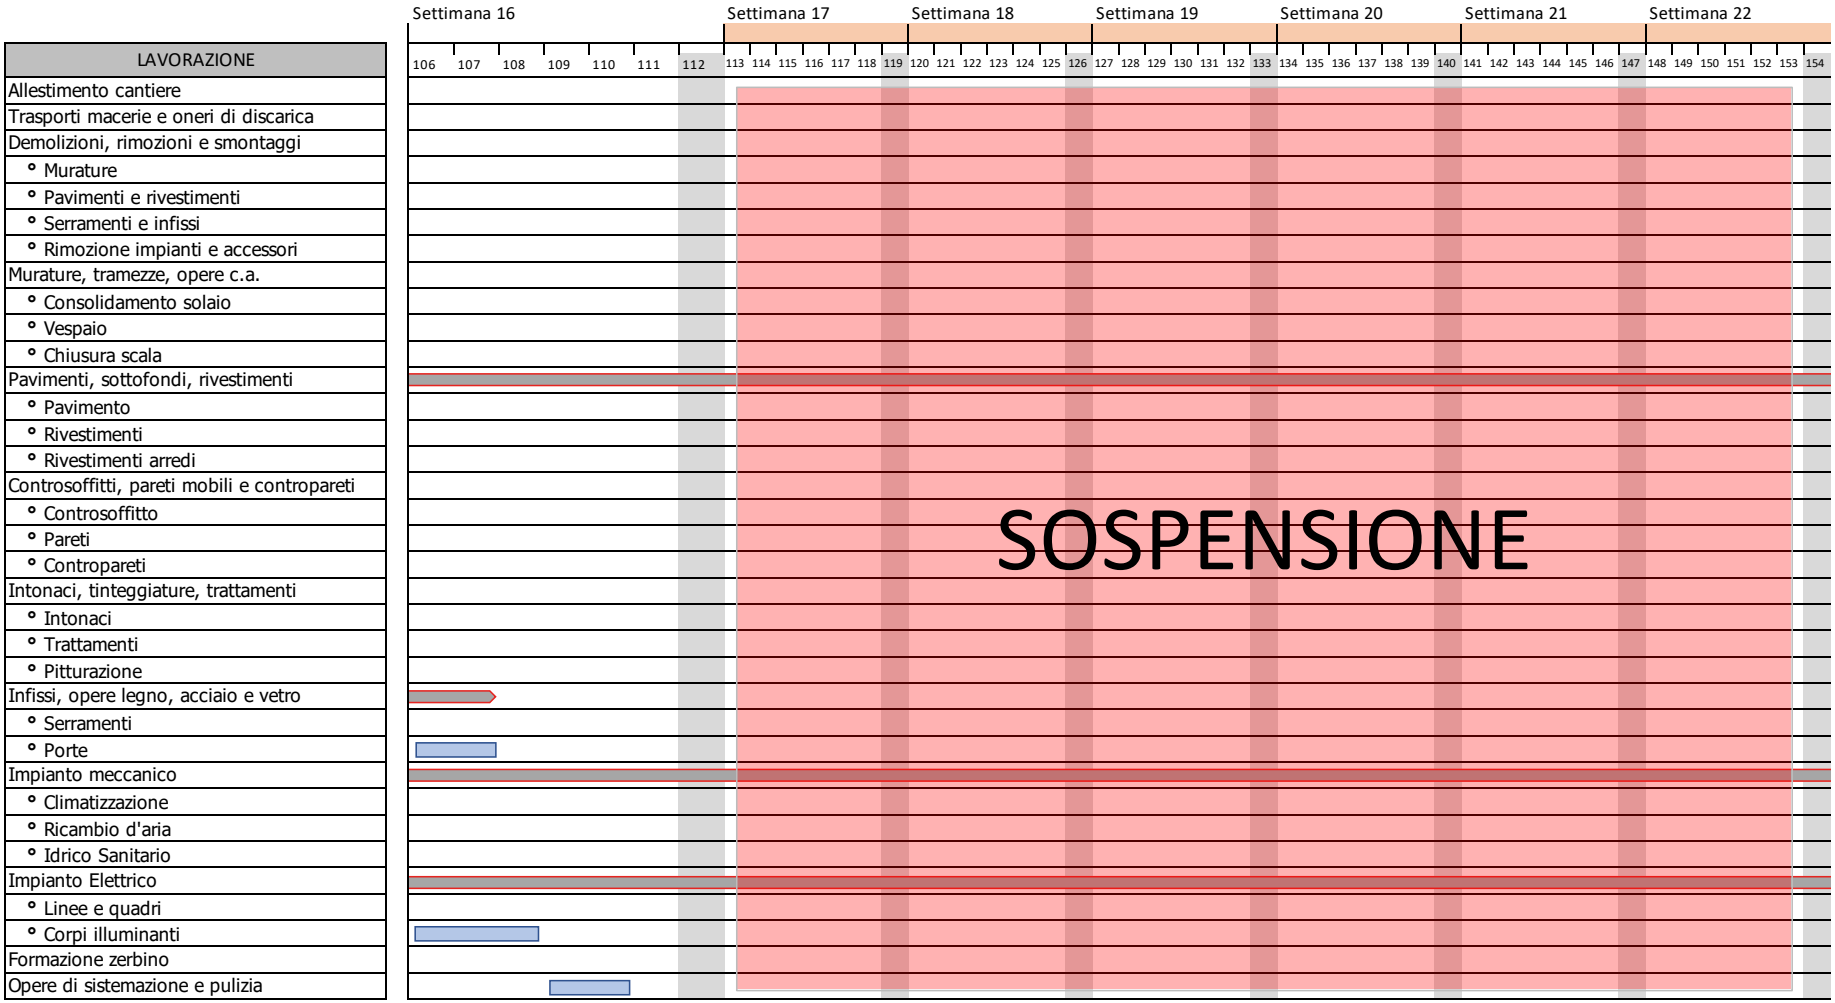
Settimana 16
Settimana 17
Settimana 18
Settimana 19
Settimana 20
Settimana 21
Settimana 22
LAVORAZIONE
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
Allestimento cantiere
Trasporti macerie e oneri di discarica
Demolizioni, rimozioni e smontaggi
° Murature
° Pavimenti e rivestimenti
° Serramenti e infissi
° Rimozione impianti e accessori
Murature, tramezze, opere c.a.
° Consolidamento solaio
° Vespaio
° Chiusura scala
Pavimenti, sottofondi, rivestimenti
° Pavimento
° Rivestimenti
° Rivestimenti arredi
Controsoffitti, pareti mobili e contropareti
° Controsoffitto
° Pareti
° Contropareti
Intonaci, tinteggiature, trattamenti
° Intonaci
° Trattamenti
° Pitturazione
Infissi, opere legno, acciaio e vetro
° Serramenti
° Porte
Impianto meccanico
° Climatizzazione
° Ricambio d'aria
° Idrico Sanitario
Impianto Elettrico
° Linee e quadri
° Corpi illuminanti
Formazione zerbino
Opere di sistemazione e pulizia
SOSPENSIONE

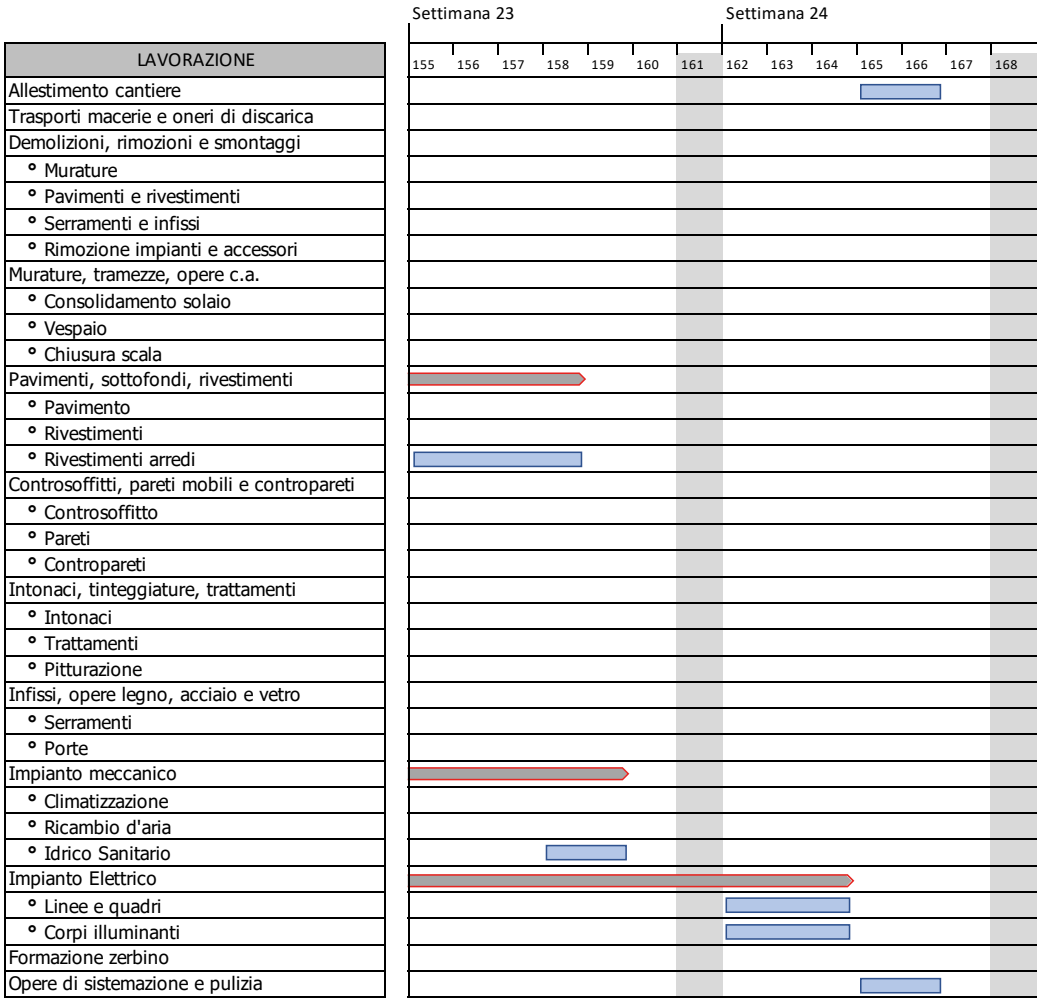
Settimana 23
Settimana 24
LAVORAZIONE
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
Allestimento cantiere
Trasporti macerie e oneri di discarica
Demolizioni, rimozioni e smontaggi
° Murature
° Pavimenti e rivestimenti
° Serramenti e infissi
° Rimozione impianti e accessori
Murature, tramezze, opere c.a.
° Consolidamento solaio
° Vespaio
° Chiusura scala
Pavimenti, sottofondi, rivestimenti
° Pavimento
° Rivestimenti
° Rivestimenti arredi
Controsoffitti, pareti mobili e contropareti
° Controsoffitto
° Pareti
° Contropareti
Intonaci, tinteggiature, trattamenti
° Intonaci
° Trattamenti
° Pitturazione
Infissi, opere legno, acciaio e vetro
° Serramenti
° Porte
Impianto meccanico
° Climatizzazione
° Ricambio d'aria
° Idrico Sanitario
Impianto Elettrico
° Linee e quadri
° Corpi illuminanti
Formazione zerbino
Opere di sistemazione e pulizia
